



Progress Report Nr. 13 // 17.09.2024

// Projekt

LZ Helukabel Bremgarten

// Bauherr

Helukabel AG

// Baustellenanschrift

Oberebenestrasse 43, 5620 Bremgarten

// Auftragsnummer

CL0127

// Projektleitung

// Marc Bernet

Tel.: +41 79 255 52 74

marc.bernet@goldbeck-rhomberg.com

// Bauleitung

// Frank Schade

Tel.: +41 79 781 02 74


frank.schade@goldbeck-rhomberg.com

// Youness Emami Amin

Tel.: +41 79 561 90 63

youness.emamiamin@goldbeck-rhomberg.com

Progress Report // Lageplan – Aufnahmegerichtungen

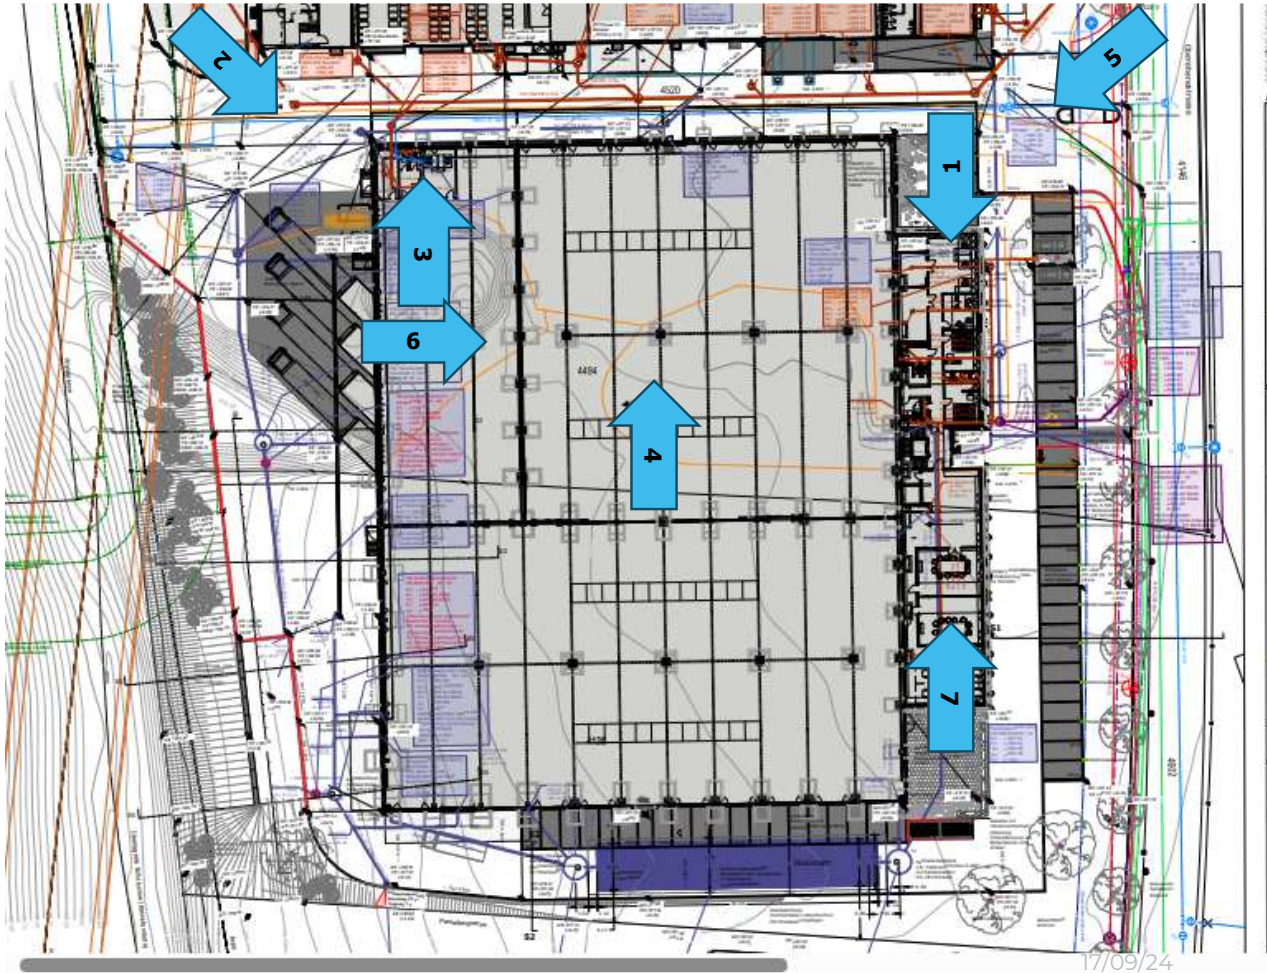


Progress Report // Beginn Trockenbau Büro EG

Foto 1



17/09/24



3


**GOLDBECK
RHOMBERG**

Progress Report // Fertigstellung Fassade Halle / Erstellung Bodenplatte Treppenturm

Foto 2



Foto aus Progress Report Nr. 12

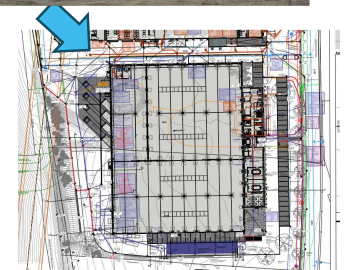

17/09/24

4


**GOLDBECK
RHOMBERG**

Progress Report // Montage Sektionaltore / Erstellung Bodenverstärkung bei den Rampen

Foto 3



Foto aus Progress Report Nr. 12



17/09/24

5


**GOLDBECK
RHOMBERG**

Progress Report // Erstellung Hallensohle

Foto 4



Foto aus Progress Report Nr. 12



17/09/24

6


**GOLDBECK
RHOMBERG**

Progress Report // Montage Fenster Büro EG

Foto 5



Foto aus Progress Report Nr. 12

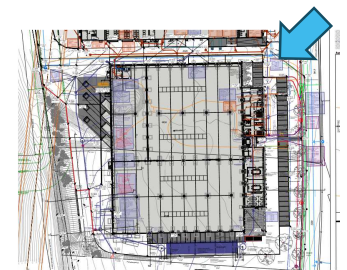

17/09/24

7


**GOLDBECK
RHOMBERG**

Progress Report // Verkabelung Photovoltaik / Aufbringen Substrat-Kies Dach Halle und Büro

Foto 6



Foto aus Progress Report Nr. 12



17/09/24

8


**GOLDBECK
RHOMBERG**

Progress Report // Aufbringen Substrat-Kies Dach Büro / Montage Wechselrichter

Foto 7



Foto aus Progress Report Nr. 12



17/09/24

9

**GOLDBECK
RHOMBERG**

Progress Report // Status Quo

Laufende Gewerke KW 38

- // - Fortführung Montage Büro Fassade
- // - Erstellung Bodenplatte für Treppenturm
- // - Erstellung Hallensole
- // - Fertigstellung Montage Fenster Kantteile Halle
- // - Fertigstellung Stützmauer Teil-2
- // - Beginn Montage Photovoltaik Verkabelung
- // - Fertigstellung Montage Vordächer
- // - Beginn Trockenbau Büro

Progress Report // Ausblick

Start neuer + laufender Gewerke KW 39 -40

- // - Fertigstellung Bodenplatte Halle & Bodenplatte Tiefhof
- // - Fortführung Montage Fenster Fassade Büro
- // - Beginn Arbeiten Elektro Installation Büro
- // - Fortführung Anfüllung Stützmauer
- // - Fortführung Trockenbau Büro
- // - Beginn Arbeiten Lüftung-Sanitär und Heizung Büro
